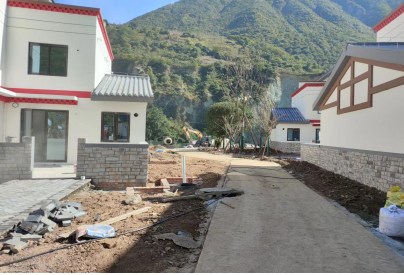


“9.5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表



序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片
1	甘孜州农村住房维修加固	甘孜州	康定市 泸定县 丹巴县 九龙县 雅江县 海螺沟	维修加固	维修加固农村住房19662户，其中康定市3203户、泸定县12928户、丹巴县53户、九龙县1458户、雅江县1260户、海螺沟760户。	4326	完工	 

“9.5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表


序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片	
2	甘孜州农村住房恢复重建	甘孜州	康定市 泸定县 九龙县 雅江县 海螺沟	恢复重建	恢复重建农村住房5335户（含避险搬迁619户）、共78.36万平方米，其中康定市34户、泸定县3581户（含避险搬迁490户）、九龙县111户、雅江县10户、海螺沟1599户（含避险搬迁129户）。货币化安置受灾居民727户，其中泸定县695户、九龙县6户、海螺沟26户。	18656	已完工。 泸定县统规自建任务户2074户、主体完工2043户，统规统建任务户数319户、主体完工255户，购房安置62户、货币安置518户，均已签订协议；海螺沟统规自建任务户543户、框架主体完工470户，统规统建任务户数401户、框架主体完工139户，购房安置4户、货币安置101户，均已签订协议；康定市统规自建户30户，主体完工30户；九龙县统规自建户109户、主体完工109户，货币安置6户，均已签订协议并兑付资金36万元；雅江县统规自建户10户，主体完工9户。	         	

“9.5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表								
序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片
								2023.11.03 甘孜藏族自治州·祝桑村  水印相机 
3	甘孜州城镇住房维修加固	甘孜州	康定市 泸定县 海螺沟	维修加固	维修加固城镇住房1102户，其中康定市546户、泸定县179户、海螺沟377户。	242	完工。	 泸定县“9.5”地震市政灾后 房屋重建项目 施工总指挥：彭晓林（泸定县） 加拿大总指挥：2023.12.15 14:32 地 址：甘孜藏族自治州泸定县 监理单位：四川蜀城市建设工程咨询有限公司 
								

“9.5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片
4	甘孜州城镇住房恢复重建	甘孜州	康定市 泸定县 海螺沟	恢复重建	恢复重建城镇住房331户、共2.59万平方米，其中康定市8户、泸定县35户、海螺沟288户。货币化安置海螺沟受灾居民1户。	1062	完工。	  
5	泸定县级集中式饮用水源地水质监测站建设	甘孜州	泸定县	新建	建设水质监测站1座，配置相应设施设备。	450	完工。	    
								

“9.5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片	
6	泸定县环境监测站建设	甘孜州	泸定县	新建	建设环境监测站1座，面积2400平方米，其中环境监测站实验用房1600平方米，业务用房300平方米。	1000	完成总工程量36%。	   	
7	泸定县集中安置点生活垃圾设施建设项目	甘孜州	泸定县	新建	新建磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村5个集中安置点的垃圾设施，包括风景式垃圾桶（亭）62处、压缩式垃圾转运车（8立方米）2辆、压缩式垃圾转运车（12立方米）1辆。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚安乡等15个集中安置点的垃圾设施，包括风景式垃圾桶（亭）560处、压缩式垃圾转运车（8立方米）15辆。	761	统规统建完工，统规自建完成50%（设施设备采购需与施工进度结合，采购设备暂未进场）	 	
8	泸定县集中安置点内部道路建设项目	甘孜州	泸定县	新建	新建磨西镇磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村5个集中安置点的联户路及入户路6.2公里，太阳能路灯59盏及挡墙工程。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚	8633	统规统建完工，统规自建完成90%。	   	




“9.5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片	
					安乡等15个集中安置点的联户路及入户路16.35公里，太阳能路灯944盏及挡墙工程。				
9	泸定县集中安置点应急避险场所建设项目	甘孜州	泸定县	新建	新建磨西镇磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村5个集中安置点的应急避险场所（总面积约8800平米）。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚安乡等15个集中安置点的的应急避险场所（共7个水泥硬化坝子，每个500平米、总面积约3500平米）。	1116	统规统建完工，统规自建完成76%。		
10	甘孜州海螺沟中学	甘孜州	海螺沟	恢复重建	改扩建校舍4496平方米，维修加固校舍4681平方米，维修改造运动场1200平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	2287	主体已完工，已启动装饰工程。		
11	甘孜州海螺沟寄宿制小学	甘孜州	海螺沟	维修加固	维修加固校舍14422方米，维修改造运动场1000平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	1156	主体施工已完成，进行装饰工程中		


“9.5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片	
					复建设附属设施。		柱中。		
12	甘孜职业学院	甘孜州	海螺沟	维修加固	维修加固校舍55395平方米，恢复重建校舍400平方米及附属设施，配备设施设备。	5428	完成总工程量60%。甘孜职业学院2个应急项目已完工；政府采购项目共计8个，总投资3587万元，6个采购项目已开标并进场，2个项目已完成清单编制，本月底启动采购工作；基建项目1个，总投资1850万元，预计6月启动招标工作。		
13	海螺沟景区人民医院（甘孜州皮肤病防治院）	甘孜州	海螺沟	恢复重建	维修加固房屋4500平方米、围墙约3000米、堡坎约100米及附属设施等。新建门急诊楼、住院楼等约11000平方米，配套污水处理、配电、绿化等设施 and 医疗设备。	6800	完成主体施工。进入装饰工程阶段。		
14	泸定县新闻出版和文化服务设施	甘孜州	泸定县	维修加固	维修加固磨西镇、燕子沟镇、得妥镇、德威镇、泸桥镇、冷碛镇文化院坝墙体，购置磨西镇、燕子沟镇、得妥镇、德威镇、冷碛镇新时代文明实践站（所）设施设备，购置磨西镇、县广播电视台设施设备。	1208	维修加固已完成，设备采购工作已完成。 泸定县：完成总工程量的80% 海螺沟：完成总工程量的28.28%		 


“9.5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片		
										
15	海螺沟老年养 护院（海螺沟 中心敬老院重 建项目）	甘孜州	海螺沟	恢复重建	恢复重建海螺沟老年养护院 5000平方米，床位100张，配 备设施设备。	1594	完成总工程量的 30%。土方开 挖，正在进行基 底捡平。			
16	甘孜州泸定老 年养护院	甘孜州	泸定县	维修加固	维修加固墙体、挡土墙等9894 平方米，配套完善步行道路、 绿化、变配电箱、基础设施、围 墙、排水排污、文化墙等，改 造2号楼、8号楼、9号楼。	978	完成总工程量的 60%。			
17	泸定县冷碛镇 社会福利和救 助管理站	甘孜州	泸定县	维修加固	恢复重建洗衣房、公共厕所 100平方米，维修加固受损墙 体558平方米，提升50张床位 护理能力，配备相关设施设备 。	283	完工。正在准备 验收。			
18	甘孜州社会福 利院	甘孜州	康定市	维修加固	维修加固房屋3500平方米，改 造提升现有建筑，维修加固围 墙和堡坎。	159	已完工，等待验 收。			

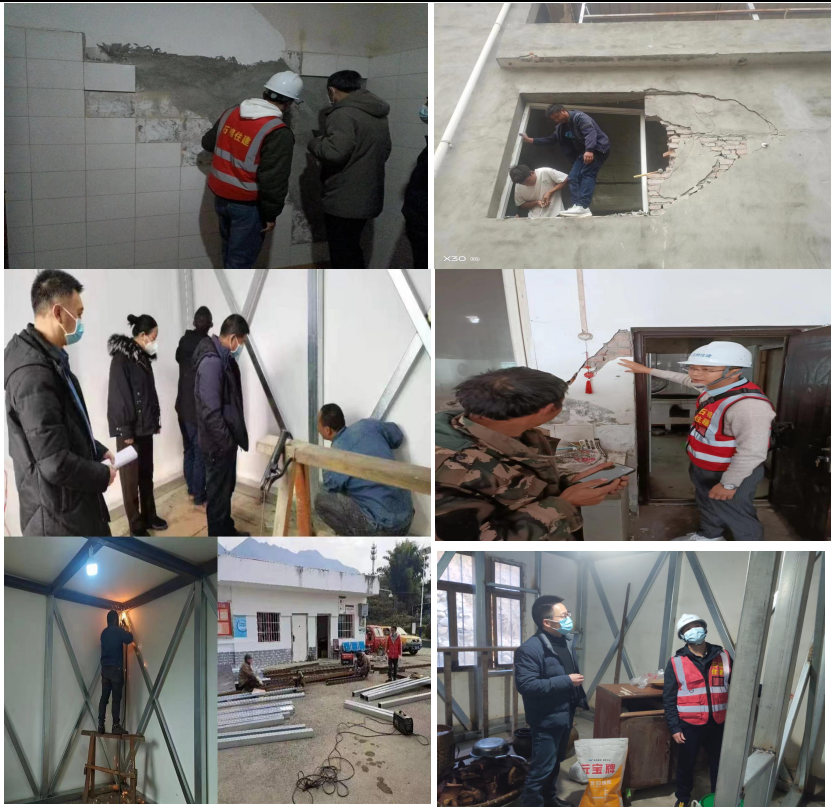
“9.5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片
								
19	甘孜州救助管理站	甘孜州	康定市	维修加固	维修加固房屋1500平方米，修复屋面、墙面。	60	完工。待验收。	


“9.5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片
20	S217泸定至石棉段	甘孜州	泸定县	恢复重建	恢复重建三级公路，其中泸定县甘谷地至得妥段32.1公里	7779	完成总工程量90%。路基工程完成100%，路面工程完成80%，桥涵工程完成100%。	   
21	海螺沟景区公路	甘孜州	泸定县 海螺沟	恢复重建	恢复重建三级公路29.096公里。	25000	已完工。待验收。	   
22	王岗坪景区公路	甘孜州	泸定县	恢复重建	恢复重建双车道公路，其中泸定县5公里。	1275	完成总工程量80%	 

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片
23	雅安市农村住房维修加固	雅安市	石棉县 汉源县 荥经县 天全县	维修加固	维修加固农村住房11805户， 其中石棉县11767户、汉源县 26户、荥经县7户、天全县5户 。	2597	石棉县、汉源县 已完工。	

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片
24	雅安市农村住房恢复重建	雅安市	石棉县 汉源县	恢复重建	恢复重建农村住房3849户（含避险搬迁386户）、共57.74万平方米，其中石棉县3644户（含避险搬迁315户）、汉源县205户（含避险搬迁71户）。货币化安置汉源县受灾居民	12052	已完工。	
25	雅安市城镇住房维修加固	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固城镇住房3322户。	731	已完工。	
26	雅安市城镇住房恢复重建	雅安市	石棉县	恢复重建	恢复重建城镇住房112户、共1.68万平方米。	358	已完工。	
27	汉源县集中安置点内部道路建设项目	雅安市	汉源县	新建	新建汉源县宜东镇海亭村、富庄镇二郎河、大树镇麦坪村3个集中安置点的内部生产生活道路约3千米，路灯122盏。	700	已完工。	
28	石棉县王岗坪小学	雅安市	石棉县	恢复重建	改扩建校舍9100平方米，建设运动场5000平方米及附属设施，配备设施设备。	4175	小学地基处理已完成100%，基础完成100%，主体已完工，二次结构施工完成100%，装饰装修完成60%，外墙施工完成65%，水电安装完成45%，连廊进场施工，球场出土完成45%。总工程量完成80%。	

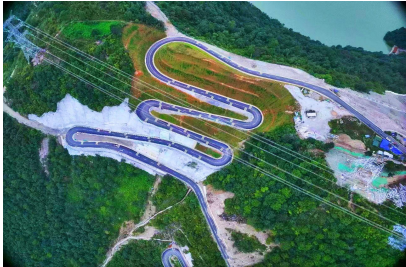
“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片
29	石棉县幼儿园	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固校舍5860平方米，改造校舍8900平方米，扩建运动场2500平方米，恢复重建附属设施，配备设施设备。	3031	已完工。	  
30	石棉县向阳小学	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固校舍共5702平方米，维修运动场2230平方米，改造校舍4270平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	1358	已完工。	   
					维修加固石棉县医疗卫生机构业务用房 62763平方米，附属设施及设备购置，其中石棉县人民医院业务用房27509平方米、石棉县疾控中心业务用房4221平方米、石棉县妇计中心业务用房16706平方米。			 

“9.5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片
31	石棉县医疗卫生机构	雅安市	石棉县	维修加固	业务用房4279.8平方米、安顺场镇县域医疗次中心业务用房2409平方米、新民乡卫生院业务用房5572.6平方米、丰乐乡卫生院业务用房2571平方米、迎政乡卫生院业务用房3201.8平方米、永和乡卫生院业务用房3803.9平方米、蟹螺乡卫生院业务用房3253.1平方米、新棉社区卫生服务中心业务用房5134平方米、新民乡小马村等10个村卫生室807.8平方米。	3200	土建已完成近80%的工程量，采购已完工。	 
32	石棉县乡镇（街道）综合文化站（中心）	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固10个乡镇（街道）综合文化站4103平方米，购置相关设施设备。	560	石棉县乡镇（街道）综合文化站（中心）加固及设备设施购置项目，完成总工程量的70%。	   
33	石棉县村级全民健身场地恢复重建及设备购置项目	雅安市	石棉县	恢复重建	恢复重建51个村（社区）级全民健身场地，配套健身器材等。	1482	石棉县村级全民健身场地恢复重建及设备购置项目已完成安顺场镇安顺村，新民乡海尔村，美罗碾子村，迎政乡八牌坊村4个点。	 

“9.5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片
							膜结构，其余正在 在进行草科乡4个 点位的场坪工作。	 
34	石棉县养老服务 机构	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固石棉县福利院约 11100平方米、第二敬老院约 10000平方米、第三敬老院约 7000平方米、新棉街道日间照 料中心约600平方米，配备设 施设备。	849	已完工。	  
35	石棉县农村公 益性墓地	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固草科乡、王岗坪乡、 新民乡公益性墓地墓区道路、 墓台、墓穴、围栏、大门等， 提升改造入院道路、文化宣传 等，配套设施设备。提升改造 丰乐、迎政、美罗、永和、蟹 螺、安顺场等乡镇公益性墓 地，增加园区绿化、文化宣传 等设施。	492	已完工。	
36	王岗坪景区公 路	雅安市	石棉县		恢复重建双车道公路，其中石 棉县54公里。	13725	已完工。	 

“9.5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片
37	凉山州农村住房维修加固	凉山州	冕宁县 甘洛县	维修加固	维修加固农村住房487户，其中冕宁县468户、甘洛县19户。	108	已完工。	联合抽查验收 准庄 吉克克格 11 : 40 : 41 2023-08-25 星期五 四川省凉山彝族自治州冕宁县 县里庄镇 雍岭江 马克相机已验证照片真实性 联合抽查验收 里庄 吉克拉布 11 : 59 : 49 2023-08-25 星期五 四川省凉山彝族自治州冕宁县 县里庄镇 多前峰村民委员会 马克相机已验证照片真实性 联合抽查验收 永水镇 段强 13 : 30 : 16 2023-08-30 星期三 四川省凉山彝族自治州冕宁县 县里庄镇 永水镇 马克相机已验证照片真实性 联合抽查验收 里庄 吉克拉布 15 : 22 : 38 2023-08-28 星期一 四川省凉山彝族自治州冕宁县 县和安藏族乡 大秋房 马克相机已验证照片真实性 联合抽查 里庄 吉克拉布 14 : 10 : 18 2023-08-25 星期五 四川省凉山彝族自治州冕宁县 县里庄镇 皮罗口 马克相机已验证照片真实性

“9.5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目进展	项目实施照片
38	凉山州农村住房恢复重建	凉山州	冕宁县	恢复重建	恢复重建农村住房3户、共0.05万平方米。	10	已完工。	
