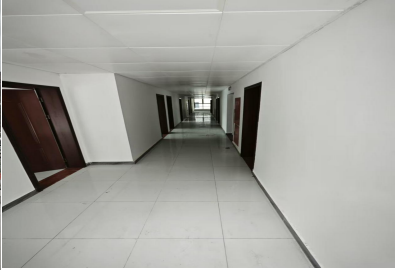



“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
1	甘孜州农村住房维修加固	甘孜州	康定市 泸定县 丹巴县 九龙县 雅江县 海螺沟	维修加固	维修加固农村住房19662户，其中康定市3203户、泸定县12928户、丹巴县53户、九龙县1458户、雅江县1260户、海螺沟760户。	4326	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持甘孜州农村住房维修加固情况为：康定市3063户，泸定县12365户，丹巴县53户，九龙县1431户，雅江县1163户，海螺沟760户。拨付资金4143.7万元。
2	甘孜州农村住房恢复重建	甘孜州	康定市 泸定县 九龙县 雅江县 海螺沟	恢复重建	恢复重建农村住房5335户（含避险搬迁619户）、共78.36万平方米，其中康定市34户、泸定县3581户（含避险搬迁490户）、九龙县111户、雅江县10户、海螺沟1599户（含避险搬迁129户）。货币化安置受灾居民727户，其中泸定县695户、九龙县6户、海螺沟26户。	18656	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持甘孜州农村住房恢复重建情况为：康定市30户，泸定县2965户，九龙县116户，雅江县1户，海螺沟1002户。拨付资金12351.6万元。
3	甘孜州城镇住房维修加固	甘孜州	康定市 泸定县 海螺沟	维修加固	维修加固城镇住房1102户，其中康定市546户、泸定县179户、海螺沟377户。	242	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持甘孜州城镇住房维修加固情况为：康定市311户，泸定县179户，海螺沟377户。拨付资金190.3956万元。
4	甘孜州城镇住房恢复重建	甘孜州	康定市 泸定县 海螺沟	恢复重建	恢复重建城镇住房331户、共2.59万平方米，其中康定市8户、泸定县35户、海螺沟288户。货币化安置海螺沟受灾居民1户。	1062	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持甘孜州城镇住房恢复重建情况为：康定市7户，泸定县21户，海螺沟277户。拨付资金975.66万元。
5	泸定县级集中式饮用水源地水质监测站建设	甘孜州	泸定县	新建	建设水质监测站1座，配置相应设施设备。	450	已完工，已开展审计工作。	已完工，已审计。总计拨付项目资金299.755万元。 

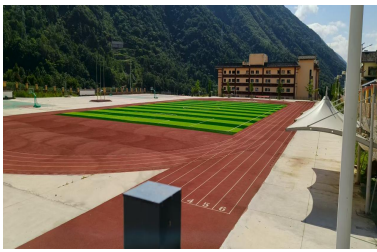
“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
6	泸定县环境监测站建设	甘孜州	泸定县	新建	建设环境监测站1座，面积2400平方米，其中环境监测站实验用房1600平方米，业务用房300平方米。	1000	已完工，已开展审计工作。	项目已完工、验收并投入使用，经竣工财务决算审计，该项目总计支出780.107121万元，拨付项目资金780.107121万元，项目剩余219.892879万元，待“9·5”泸定地震恢复重建项目整体完结后，统筹安排剩余资金。    
7	泸定县集中安置点生活垃圾设施建设项目	甘孜州	泸定县	新建	新建磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村5个集中安置点的垃圾设施，包括风景式垃圾桶（亭）62处、压缩式垃圾转运车（8立方米）2辆、压缩式垃圾转运车（12立方米）1辆。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚安乡等15个集中安置点的垃圾设施，包括风景式垃圾桶（亭）560处、压缩式垃圾转运车（8立方米）15辆。	761	已完工，待审计。	已完工，待审计。该项目已于2024年9月完工并组织验收（海螺沟集中安置点垃圾转运车采购推进中），截至目前已拨付项目资金520.7万元，待完成审计后拨付项目尾款。    

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
8	泸定县集中安置点内部道路建设项目	甘孜州	泸定县	新建	新建磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村5个集中安置点的联户路及入户路6.2公里，太阳能路灯59盏及挡墙工程。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚安乡等15个集中安置点的联户路及入户路16.35公里，太阳能路灯944盏及挡墙工程。	8633	已完工，待审计。	已完工，待审计。该项目已于2024年9月完工并组织验收，截至目前已拨付项目资金6043.1万元，待完成审计后拨付项目尾款。    
9	泸定县集中安置点应急避险场所建设项目	甘孜州	泸定县	新建	新建磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村5个集中安置点的应急避险场所（总面积约8800平米）。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚安乡等15个集中安置点的的应急避险场所（共7个水泥硬化坝子，每个500平米、总面积约3500平米）。	1116	已完工，待审计。	已完工，待审计。已拨付泸定县所属的项目113.4万元，已拨付海螺沟所属项目667.8万元。    


“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
10	甘孜州海螺沟中学	甘孜州	海螺沟	恢复重建	改扩建校舍4496平方米，维修加固校舍4681平方米，维修改造运动场1200平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	2287	已完工，待审计。	已完工，待审计。截至目前已拨付项目资金1600.9万元，项目已启动竣工结算和审计工作，完成后拨付项目尾款。  
11	甘孜州海螺沟寄宿制小学	甘孜州	海螺沟	维修加固	维修加固校舍14422方米，维修改造运动场1000平方米，恢复建设附属设施。	1156	已完工，待审计。	已完工，待审计。截至目前已拨付项目资金809.2万元，项目已启动竣工结算和审计工作，完成后拨付项目尾款。    

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
12	甘孜职业学院	甘孜州	海螺沟	维修加固	维修加固校舍55395平方米，恢复重建校舍400平方米及附属设施，配备设施设备。	5428	已完工，已审计，已拨付尾款。	项目已完工，已审计。总计拨付项目资金5428万元。
								   
13	海螺沟景区人民医院（甘孜州皮肤病防治院）	甘孜州	海螺沟	恢复重建	维修加固房屋4500平方米、围墙约3000米、堡坎约100米及附属设施等。新建门急诊楼、住院楼等约11000平方米，配套污水处理、配电、绿化等设施 and 医疗设备。	6800	已完工，已审计，已拨付尾款。	该项目已完工，并完成项目审计工作，总计拨付资金6799.55973万元。
								   

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
14	泸定县新闻出版和文化服务设施	甘孜州	泸定县、海螺沟	维修加固	维修加固磨西镇、燕子沟镇、得妥镇、德威镇、泸桥镇、冷碛镇文化院坝墙体，购置磨西镇、燕子沟镇、得妥镇、德威镇、冷碛镇新时代文明实践站（所）设施设备，购置磨西镇、县广播电视台设施设备。	1208	泸定县：已完工，已审计，已拨付尾款。 海螺沟：已完工，待审计。	新闻出版和文化服务设施（泸定县）项目已完成，已审计，总计拨付项目资金526.05324万元。新闻出版和文化服务设施（海螺沟）项目，已完工，待审计，截至目前已拨付项目资金430.325万元。      

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
15	海螺沟老年养护院（海螺沟中心敬老院重建项目）	甘孜州	海螺沟	恢复重建	恢复重建海螺沟老年养护院5000平方米，床位100张，配备设施设备。	1594	已完工，待审计。	已完工，待审计。截至目前已拨付项目资金1115.8万元，完成审计后拨付项目尾款。 
16	甘孜州泸定老年养护院	甘孜州	泸定县	维修加固	维修加固墙体、挡土墙等9894平方米，配套完善步行道路、绿化、变电箱、基础设施、围墙、排水排污、文化墙等，改造2号楼、8号楼、9号楼。	978	已完工，已审计，已拨付尾款。	已完工，已审计。项目已验收，并投入使用，截至目前已拨付项目资金953.250804万元。 

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
17	泸定县冷碛镇 社会福利和救 助管理站	甘孜州	泸定县	维修加固	恢复重建洗衣房、公共厕所100平方米，维 修加固受损墙体558平方米，提升50张床位 护理能力，配备相关设施设备。	283	已完工，已审 计，已拨付尾款 。	该项目已完工，并完成项目审计工作，总计拨付资金257.280621万元。
								 
18	甘孜州社会福 利院	甘孜州	康定市	维修加固	维修加固房屋3500平方米，改造提升现有建 筑，维修加固围墙和堡坎。	159	已完工，已审 计，已拨付尾款 。	该项目已完工，并完成项目审计工作，总计拨付资金151.083566万元。
								  

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
19	甘孜州救助管理站	甘孜州	康定市	维修加固	维修加固房屋1500平方米，修复屋面、墙面。	60	已完工，已审计，已拨付尾款。	该项目已完工，并完成项目审计工作，总计拨付资金53.246871万元。
								   
20	S217泸定至石棉段	甘孜州	泸定县	恢复重建	恢复重建三级公路，其中泸定县甘谷地至得妥段32.1公里	7779	已完工，待审计。	已完工，待审计。该项目于2025年6月完成交工验收，已启动结算审核工作，截至目前已拨付项目资金5445.3万元。
								   

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

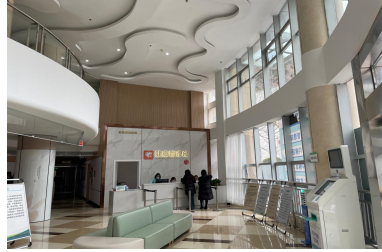
序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
21	海螺沟景区公路	甘孜州	泸定县 海螺沟	恢复重建	恢复重建三级公路29.096公里。	25000	已完工。待审计。	该项目已实施完毕，待审计，已拨付资金17500万元，已启动结算审核工作。
								   
22	王岗坪景区公路	甘孜州	泸定县	恢复重建	恢复重建双车道公路，其中泸定县5公里。	1275	已完工，待审计。	王岗坪景区公路发旺村支线项目目前工程已完成全部施工任务，交工验收检测工作已开展，已启动结算工作，待完成审计后拨付项目尾款。截至目前已拨付项目资金892.5万元。
								   

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表								
序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
23	雅安市农村住房维修加固	雅安市	石棉县 汉源县 荣经县 天全县	维修加固	维修加固农村住房11805户，其中石棉县11767户、汉源县26户、荣经县7户、天全县5户。	2597	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持雅安市农村住房维修加固情况为：石棉县11767户、汉源县26户，拨付资金2594.3601万元。
24	雅安市农村住房恢复重建	雅安市	石棉县 汉源县	恢复重建	恢复重建农村住房3849户（含避险搬迁386户）、共57.74万平方米，其中石棉县3644户（含避险搬迁315户）、汉源县205户（含避险搬迁71户）。货币化安置汉源县受灾居民62户。	12052	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持雅安市农村住房恢复重建情况为：石棉县3644户（含避险搬迁315户）、汉源县205户（含避险搬迁71户）。货币化安置汉源县受灾居民62户，拨付资金12052万元。
25	雅安市城镇住房维修加固	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固城镇住房3322户。	731	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持雅安市城镇住房维修加固情况为：石棉县3322户，拨付资金731万元。
26	雅安市城镇住房恢复重建	雅安市	石棉县	恢复重建	恢复重建城镇住房112户、共1.68万平方米。	358	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持雅安市城镇住房恢复重建情况为：石棉县112户，拨付资金358万元。
27	汉源县集中安置点内部道路建设项目	雅安市	汉源县	新建	新建汉源县宜东镇海亭村、富庄镇二郎河、大树镇麦坪村3个集中安置点的内部生产生活道路约3千米，路灯122盏。	700	已完工，待审计。	已完工，待审计。截至目前已拨付项目资金280万元，已启动审计工作，完成后拨付尾款。 

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
28	石棉县王岗坪小学	雅安市	石棉县	恢复重建	改扩建校舍9100平方米，建设运动场5000平方米及附属设施，配备设施设备。	4175	已完工，待审计。	石棉县王岗坪小学灾后恢复重建项目已完成施工，待审计。截至目前已拨付项目资金2646.268338万元。 
29	石棉县幼儿园	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固校舍5860平方米，改造校舍8900平方米，扩建运动场2500平方米，恢复重建附属设施，配备设施设备。	3031	已完工，已审计，已拨付尾款。	该项目已完工，并完成项目审计工作，总计拨付资金2879.441484万元（石棉县发改委退还我会可研报告服务费4万元）。 

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
30	石棉县向阳小学	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固校舍共5702平方米，维修运动场2230平方米，改造校舍4270平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。	1358	已完工，待审计。	已完工，待审计。截至目前已拨付项目资金950.6万元，完成审计后拨付项目尾款。 
31	石棉县医疗卫生机构	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固石棉县医疗卫生机构业务用房62763平方米，附属设施及设备购置，其中石棉县人民医院业务用房27509平方米、石棉县疾控中心业务用房4221平方米、石棉县妇计中心业务用房4279.8平方米、安顺场镇县域医疗次中心业务用房2409平方米、新民乡卫生院业务用房5572.6平方米、丰乐乡卫生院业务用房2571平方米、迎政乡卫生院业务用房3201.8平方米、永和乡卫生院业务用房3803.9平方米、蟹螺乡卫生院业务用房3253.1平方米、新棉社区卫生服务中心业务用房5134平方米、新民乡小马村等10个村卫生室807.8平方米。	3200	已完工，已审计，已拨付尾款。	已完工，已审计。项目已实施完毕，总计拨付项目资金3200万元。 

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持 金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
32	石棉县乡镇（街道）综合文化站（中心）	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固10个乡镇（街道）综合文化站4103平方米，购置相关设施设备。	560	已完工，待审计。	项目已完工，待审计，截至目前已拨付项目资金340.326514万元。
								
								 

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
33	石棉县村级全民健身场地恢复重建及设备购置项目	雅安市	石棉县	恢复重建	恢复重建51个村（社区）级全民健身场地，配套健身器材等。	1482	已完工，待审计。	项目已完工，待审计，截至目前已拨付项目资金851.1536万元。
								
34	石棉县养老服务机构	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固石棉县福利院约11100平方米、第二敬老院约10000平方米、第三敬老院约7000平方米、新棉街道日间照料中心约600平方米，配备设施设备。	849	已完工，待审计。	已完工，待审计。已投入使用，截至目前已拨付项目资金594.3万元。
								

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
35	石棉县农村公益性墓地	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固草科乡、王岗坪乡、新民乡公益性墓地墓区道路、墓台、墓穴、围栏、大门等，提升改造入院道路、文化宣传等，配套设施设备。提升改造丰乐、迎政、美罗、永和、蟹螺、安顺场等乡镇公益性墓地，增加园区绿化、文化宣传等设施。	492	已完工，待审计。	已完工，待审计。截至目前已拨付项目资金267.791964万元。
								 
36	王岗坪景区公路	雅安市	石棉县	恢复重建	恢复重建双车道公路，其中石棉县54公里。	13725	已完工，待审计。	已完工，待审计。截至目前已拨付项目资金9607.5万元。
								 
37	凉山州农村住房维修加固	凉山州	冕宁县甘洛县	维修加固	维修加固农村住房487户，其中冕宁县468户、甘洛县19户。	108	已发放冕宁县全部补助资金，已与甘洛县签订项目合作协议。	根据各地实际需求，实际支持凉山州农村住房维修加固情况为：冕宁县381户，拨付资金84.492813万元，待拨付甘洛县项目资金。
38	凉山州农村住房恢复重建	凉山州	冕宁县	恢复重建	恢复重建农村住房3户、共0.05万平方米。	10	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持凉山州农村住房恢复重建情况为：冕宁县3户，拨付资金10万元。
